

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 5867


DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO

Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 26/08/2026
Redutor: CESTARI V12331BGA0SPW0AVBA P3 - CT 21	Redução: 43,65	Série:


ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



TAG CLIENTE - ME 631514

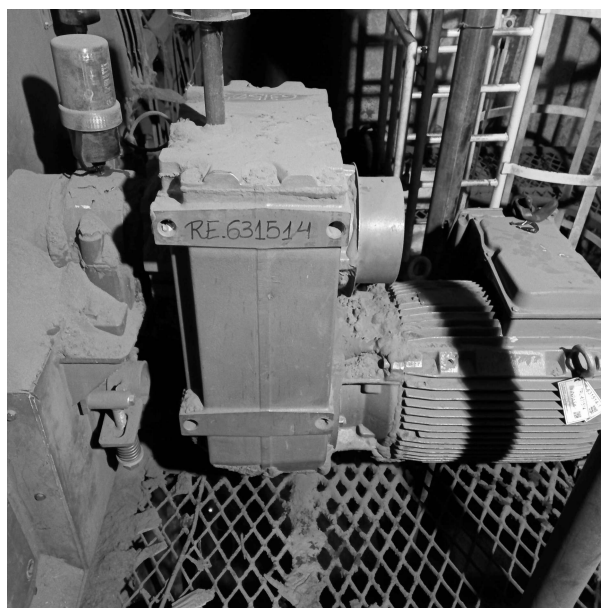

EQUIPAMENTO MONTADO - CX DE LIGAÇÃO MONTADA PARA LADO DIREITO (OLHANDO ATRAS DO MOTOR)

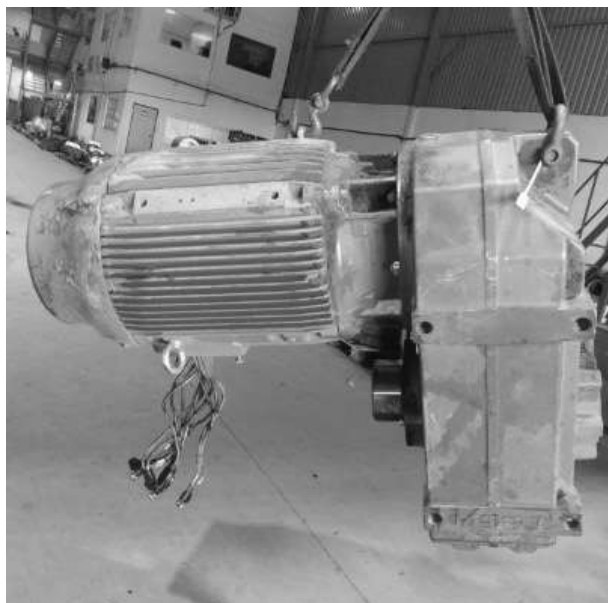

EQUIPAMENTO MOMENTO CHEGADA OFCINA



TAG: 765652

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
VALVULA RESPIRO NPT 40 MIC 1"	1	PC4948
ROLAMENTO 32028 X	2	PC4062
RETENTOR 140X210X15	2	PC18059667
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30309	1	139297
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 32209	1	32209
Busca global...		
TAMPA EXPANSAO 130 X 12	2	PC18060950
ROLAMENTO 30312 J2/Q	1	PC5273
ROLAMENTO 33210	1	PC5242
OLEO 220 EP YPF	43	18059731
PINTURA FINAL	1	SVG1174
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA

DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	2	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	3	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	2	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES

* NA DESMONTAGEM NÃO FOI IDENTIFICADO NENHUM PROBLEMA DE VAZAMENTO E OU OUTRO QUE VENHA EM PRIMEIRA ANÁLISE IDENTIFICAR PROBLEMAS CRITICOS
REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES CONFORME REGISTRO NO CAPUT: "PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO";
REALIZADO A INSTALAÇÃO DA FLNGE KTR - CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO;
